

## Relatório Mensal de Obra

20/11/2024 - 20/12/2024



# CRONOGRAMA GERAL

EDT	Nome da Tarefa	Total de Dias	Duração	Início	Término	2024											
						Ago	Set	Tri 4/2024	Out	Nov	Dez	Tri 1/2025	Jan	Feb	Mar	Tri 2/2025	Abr
<b>1</b>	<b>OAB-SE</b>	<b>273</b>	<b>188 dias?</b>	<b>Ter 01/10/24</b>	<b>Seg 30/06/25</b>												
<b>1.1</b>	<b>ETAPA 01</b>	<b>273</b>	<b>188 dias?</b>	<b>Ter 01/10/24</b>	<b>Seg 30/06/25</b>												
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	61	42 dias	Ter 01/10/24	Sex 29/11/24												
1.1.2	FUNDAÇÃO	92	63 dias	Ter 01/10/24	Ter 31/12/24												
1.1.3	SUPERESTRUTURA	123	82 dias	Sex 01/11/24	Sex 28/02/25												
1.1.4	COBERTURA METÁLICA	90	63 dias	Qui 02/01/25	Seg 31/03/25												
1.1.5	VEDAÇÕES	59	42 dias	Qui 02/01/25	Sex 28/02/25												
1.1.6	INST. ESGOTO PLUVIAL / INST. HIDRÁULICA	243	167 dias	Ter 01/10/24	Sex 30/05/25												
1.1.7	INST. ELÉTRICA	243	167 dias	Ter 01/10/24	Sex 30/05/25												
1.1.8	SPDA	59	41 dias	Seg 03/02/25	Seg 31/03/25												
1.1.9	INST. CABEAMENTO/CFTV/	90	63 dias	Seg 02/12/24	Sex 28/02/25												
1.1.10	INST. DE INCÊNDIO	212	146 dias	Seg 02/12/24	Seg 30/06/25												
1.1.11	PISO E PAVIMENTAÇÃO	120	82 dias	Seg 03/02/25	Sex 30/05/25												
1.1.12	REVESTIMENTO PAREDES E TETOS	89	61 dias	Seg 03/02/25	Qua 30/04/25												
1.1.13	CLIMATIZAÇÃO	212	146 dias	Seg 02/12/24	Seg 30/06/25												
1.1.14	PINTURA GERAL	90	62 dias	Ter 01/04/25	Seg 30/06/25												
1.1.15	PORTAS E ESQUADRIAS/ IOUÇAS E METAIS	91	62 dias?	Ter 01/04/25	Seg 30/06/25												
1.1.16	DIVERSOS SERVIÇOS/LIMPEZA GERAL	242	165 dias	Sex 01/11/24	Seg 30/06/25												
<b>1.1.17</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS</b>	<b>273</b>	<b>188 dias</b>	<b>Ter 01/10/24</b>	<b>Seg 30/06/25</b>												

## PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

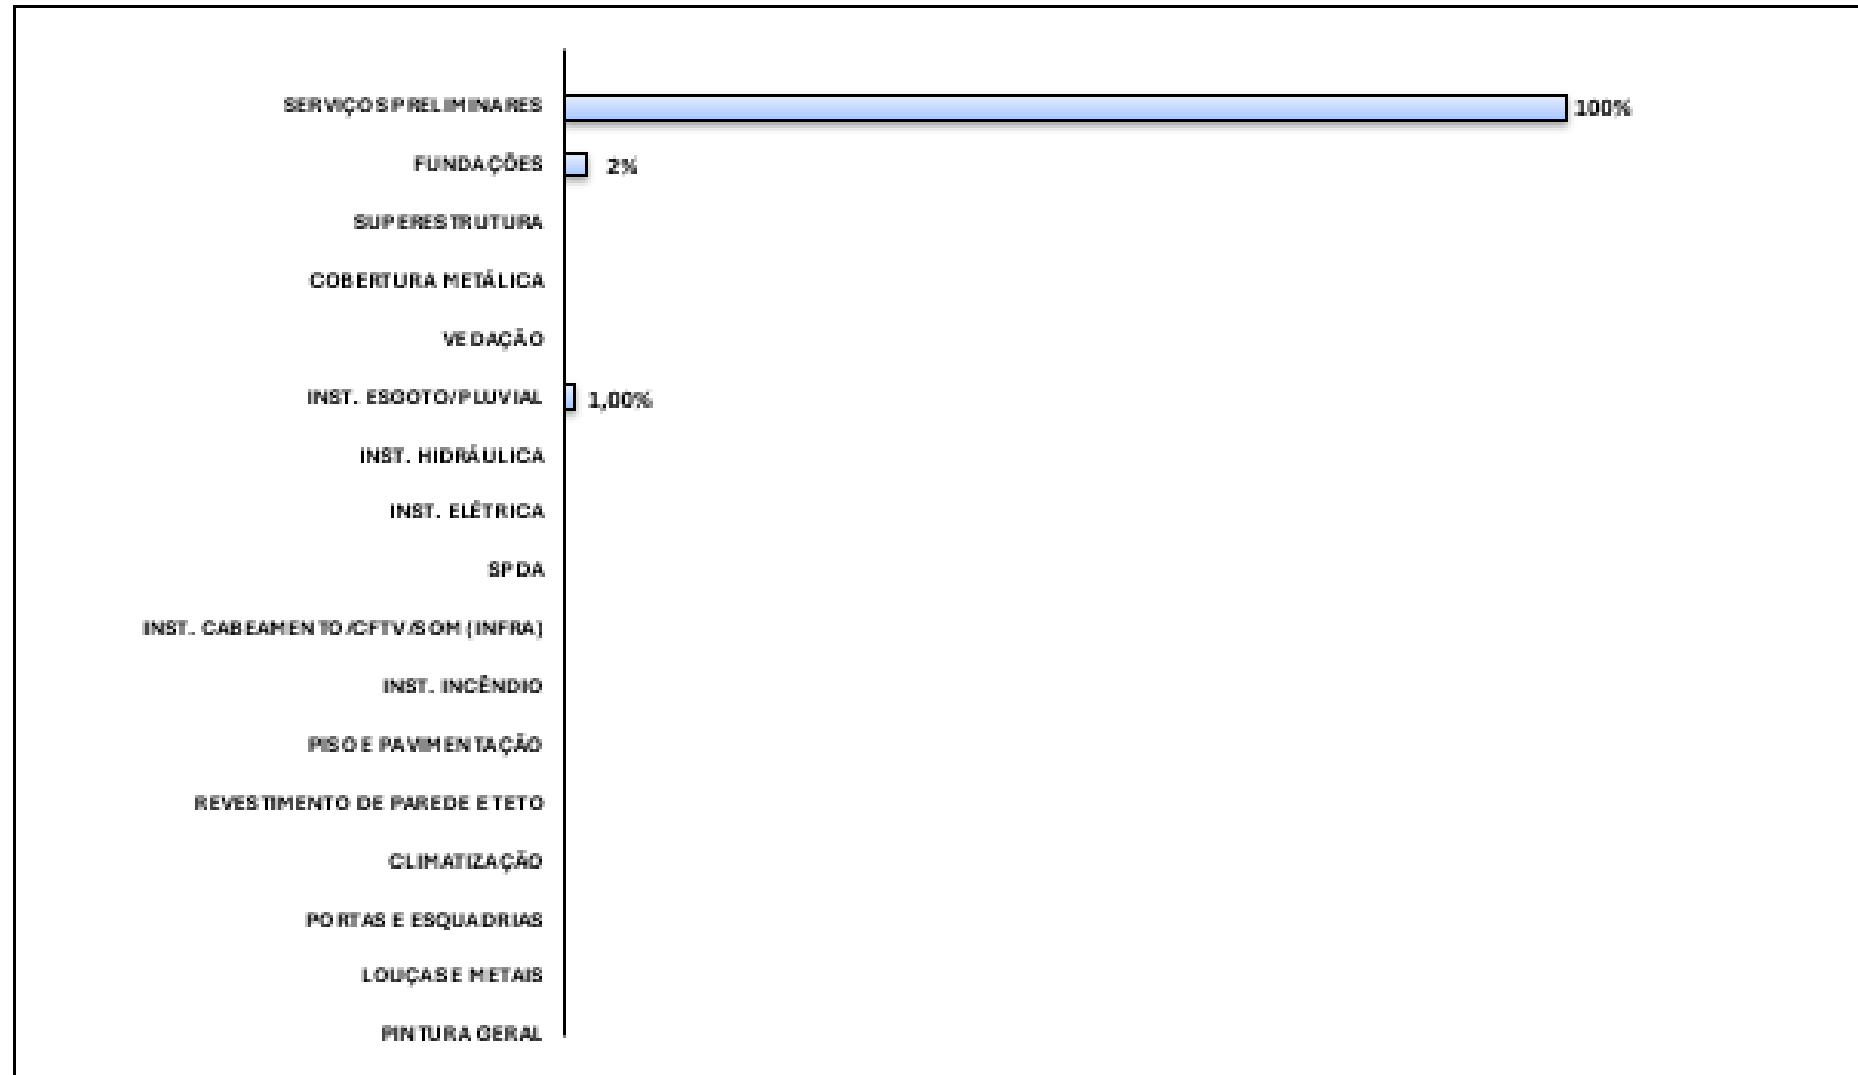




Foto 01: Fachada da Obra



Foto 02: Visão do gabarito.



Foto 03: Visão geral vista de fundo, do gabarito da fundação da obra.



Foto 04: Marcação do gabarito pelo topógrafo.



Foto 05: Visão do canteiro e container do escritório em azul e container verde do almoxarife.



Foto 06: Visão do canteiro de obra.



Foto 07: Visão do container escritório.



Foto 08: Finalização da pintura do canteiro e contrapiso.



Foto 09: Início de execução da concretagem das sapatas do muro de contenção da frente da obra .



Foto 10: Execução da fundação do muro de contenção.





Foto 11: Execução da escavação da rampa dos pedestres.



Foto 12: Execução da construção da rampa dos pedestres.



Foto 13: Execução do muro de contenção visão do lado direito .



Foto 14: Execução do muro de contenção visão do lado esquerdo.



Foto 15: Execução do muro de contenção.



Foto 16: Execução do padrão de energia.




Foto 15: Execução da escavação do reservatório.



Foto 16: Execução da escavação do reservatório.

**Técnico Responsável : Engenheiro Civil**

**Vitor Bessa Silva**

**CREA: 2716679568**



**Endereço:** Rua José de, R. José Faro Rollemberg, 455 - Salgado Filho, Aracaju - SE, 49020-020

**Telefone:** (79) 3246-6050
