

Relatório Mensal de Obra

20/10/2024 - 20/11/2024



CRONOGRAMA GERAL

| EDT | Nome da Tarefa | Total de Dias | Duração | Início | Término | 2024 | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------------|---------------------|---------------------|------|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|------------|-----|
| | | | | | | Ago | Set | Tri 4/2024 | Out | Nov | Dez | Tri 1/2025 | Jan | Feb | Mar | Tri 2/2025 | Abr |
| 1 | OAB-SE | 273 | 188 dias? | Ter 01/10/24 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | ETAPA 01 | 273 | 188 dias? | Ter 01/10/24 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 61 | 42 dias | Ter 01/10/24 | Sex 29/11/24 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | FUNDAÇÃO | 92 | 63 dias | Ter 01/10/24 | Ter 31/12/24 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3 | SUPERESTRUTURA | 123 | 82 dias | Sex 01/11/24 | Sex 28/02/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.4 | COBERTURA METÁLICA | 90 | 63 dias | Qui 02/01/25 | Seg 31/03/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5 | VEDAÇÕES | 59 | 42 dias | Qui 02/01/25 | Sex 28/02/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | INST. ESGOTO PLUVIAL / INST.HIDRÁULICA | 243 | 167 dias | Ter 01/10/24 | Sex 30/05/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.7 | INST. ELÉTRICA | 243 | 167 dias | Ter 01/10/24 | Sex 30/05/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.8 | SPDA | 59 | 41 dias | Seg 03/02/25 | Seg 31/03/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.9 | INST. CABEAMENTO/CFTV/ | 90 | 63 dias | Seg 02/12/24 | Sex 28/02/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.10 | INST. DE INCÊNDIO | 212 | 146 dias | Seg 02/12/24 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | PISO E PAVIMENTAÇÃO | 120 | 82 dias | Seg 03/02/25 | Sex 30/05/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | REVESTIMENTO PAREDES E TETOS | 89 | 61 dias | Seg 03/02/25 | Qua 30/04/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.13 | CLIMATIZAÇÃO | 212 | 146 dias | Seg 02/12/24 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | PINTURA GERAL | 90 | 62 dias | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.15 | PORTAS E ESQUADRIAS/ IOUÇAS E METAIS | 91 | 62 dias? | Ter 01/04/25 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.16 | DIVERSOS SERVIÇOS/LIMPEZA GERAL | 242 | 165 dias | Sex 01/11/24 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.17 | CUSTOS INDIRETOS | 273 | 188 dias | Ter 01/10/24 | Seg 30/06/25 | | | | | | | | | | | | |

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

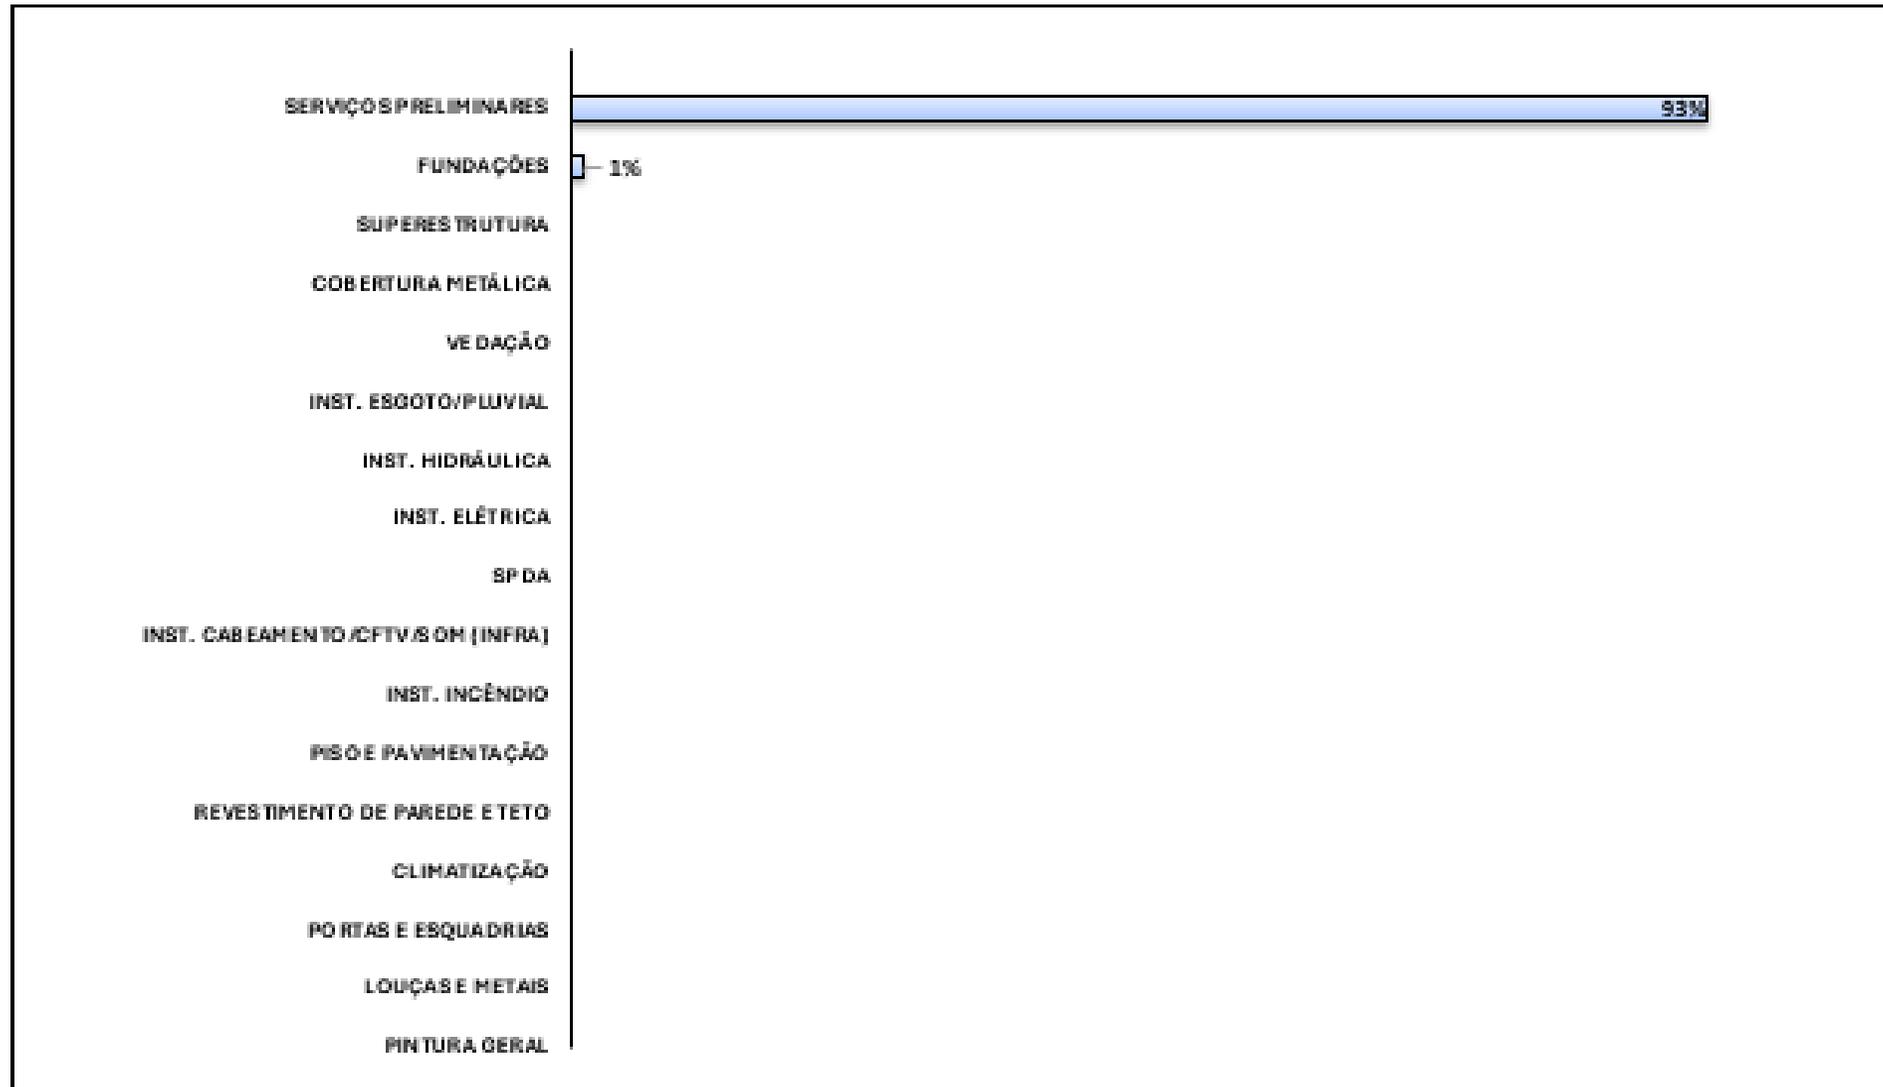




Foto 01 : Fechamento da obra com folha galvanizada.



Foto 02: Visão interna da obra com nivelamento e terraplanagem finalizada.



Foto 03: Execução da escavação da fundação do muro de contenção.



Foto 04: Início da execução do gabarito.



Foto 05: Execução do canteiro de obra.



Foto 06: Marcação dos pontos do gabarito.



Foto 07: Visão aérea da obra.



Foto 08: Visão aérea com fechamento completo da obra.



Foto 09: Finalização da pintura do lado esquerdo do fechamento da obra.



Foto 10: Finalização da pintura do lado direito do fechamento da obra.



Foto 11: Realização da escavação da fundação do muro de contenção.



Foto 12: Realização das instalações de esgoto do canteiro de obra.



Foto 13: Realização da compactação com o pé de carneiro.



Foto 14: Realização da compactação com o pé de carneiro.

Técnico Responsável : Engenheiro Civil

Vitor Bessa Silva

CREA: 2716679568



Endereço: Rua José de, R. José Faro Rollemberg, 455 - Salgado Filho, Aracaju - SE, 49020-020

Telefone: (79) 3246-6050
